

■ Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • Languedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes ■ Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne ■ Villes Agglos et Métropoles • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges



• Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers Agglomération • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • Vierzon ■ SICALA • Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

Contrat pour une gestion durable du val d'Allier alluvial

Comité de pilotage



CONTRAT TERRITORIAL
VAL D'ALLIER
ALLUVIAL

Vichy, le 7 février 2019



Programme de la journée

9h45 - 12h15 Réunion

- 1) Rappels
- 2) Point sur les financements et l'animation
- 3) Synthèse des actions 2018 et des perspectives 2019
- 4) Présentation des projets de travaux aux Mayères
Agglo Pays d'Issoire
- 5) Présentation des travaux réalisés sur le secteur de la Boucle des Isles et la rive gauche du Lac d'Allier - Vichy Communauté

12h30 -14h Repas

14h30-16h30 Visite des travaux (Boucle des Isles et Lac d'Allier)

Ordre du jour

9h45 - 12h15 Réunion

- 1) Rappels
- 2) Point sur les financements et l'animation
- 3) Synthèse des actions 2018 et des perspectives 2019
- 4) Présentation des projets de travaux aux Mayères
Agglo Pays d'Issoire
- 5) Présentation des travaux réalisés sur le secteur de la Boucle
des Isoles et la rive gauche du Lac d'Allier - Vichy Communauté

12h30 -14h Repas

14h30-16h30 Visite des travaux (Boucle des Isles et Lac d'Allier)

Rappels : animation - coordination

Volonté des acteurs locaux de maintenir la dynamique existante autour de la rivière Allier, créée dans le cadre des **Plans Loire** précédents et du **Contrat Nature** porté par la Région Auvergne sur le **val d'Allier auvergnat** entre **2008 et 2013**.

- Elaboration d'un nouveau contrat sur le val d'Allier alluvial (2015-2020) en cohérence avec la durée et la stratégie du **Plan Loire Grandeur Nature IV (2014-2020)**




Signature du contrat
8 juillet 2015
16 signataires

Rappels : territoire

Axe alluvial de l'Allier entre Vieille-Brioude et le Bec d'Allier

- Espace de mobilité optimal de la rivière Allier
- 3 régions
- 5 départements
- 270 km de linéaire de cours d'eau soit 186 km²
- 5 masses d'eau superficielle
- 2 masses d'eau souterraine
- 101 communes

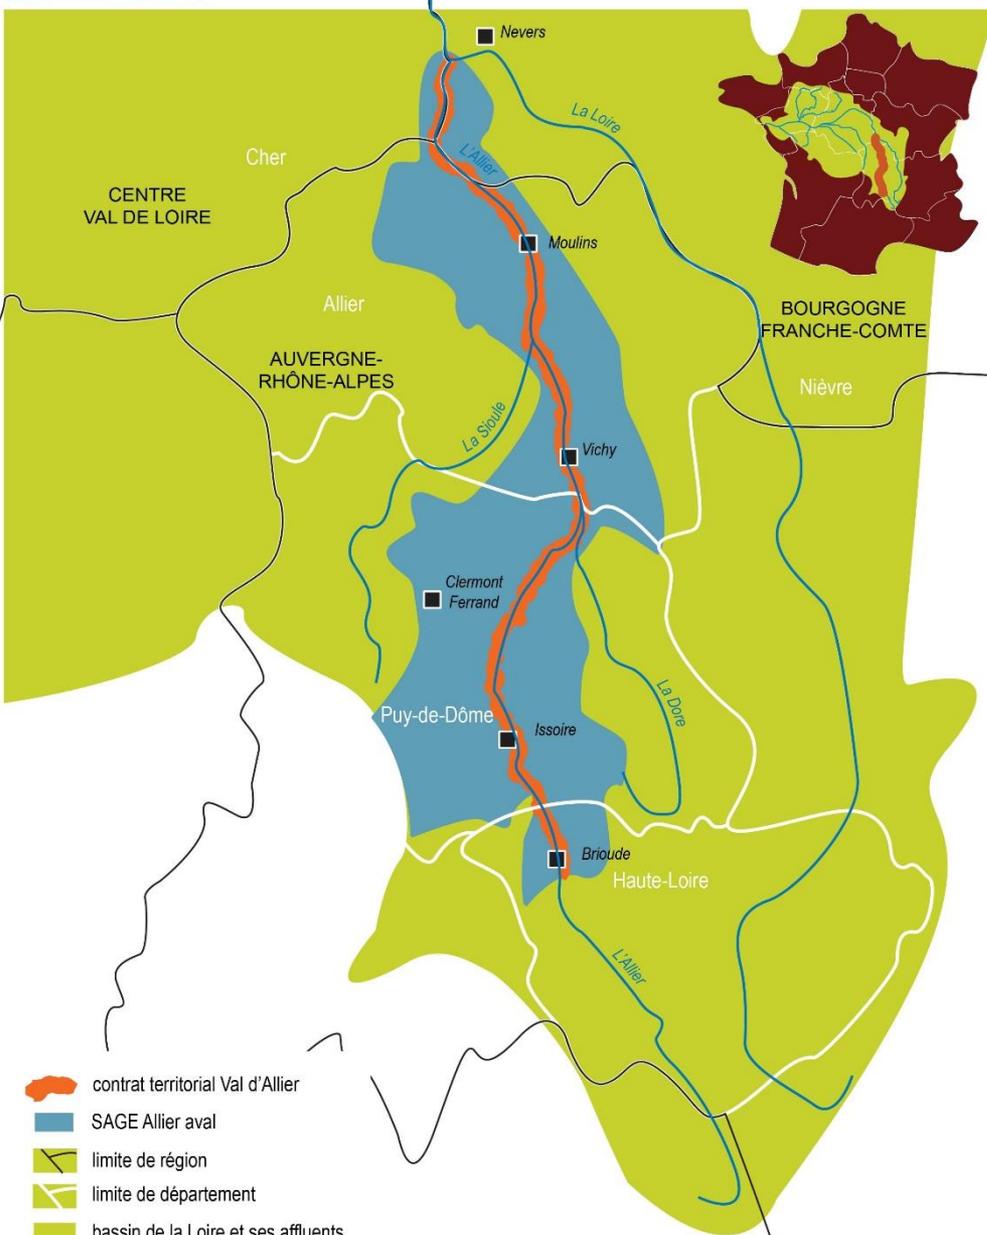

Rappels : objectifs

Fédérer un maximum d'acteurs pour mettre en place une **gestion durable du val d'Allier alluvial**, en favorisant une approche globale.

Objectifs

- Préserver voire restaurer la dynamique fluviale de l'Allier
- Maintenir et protéger les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques associés à l'axe Allier
- Valoriser et faire connaître les patrimoines naturels, et les enjeux liés à l'espace de mobilité et la dynamique fluviale
- Soutenir les partenaires et les actions engagées dans le passé dans le cadre des Plans Loire précédents
- Encourager et accompagner les nouveaux porteurs de projets dont les collectivités

Ordre du jour

9h45 - 12h15 Réunion

- 1) Rappels
- 2) Point sur les financements et l'animation
- 3) Synthèse des actions 2018 et des perspectives 2019
- 4) Présentation des projets de travaux aux Mayères
Agglo Pays d'Issoire
- 5) Présentation des travaux réalisés sur le secteur de la Boucle
des Isles et la rive gauche du Lac d'Allier - Vichy Communauté

Coordination et financements

Projet d'avenant au contrat

COPIL du 31/01/2017 : validation de la nécessité de compléter la programmation par le biais d'un avenant 2018-2020

COPIL du 06/06/2017 : validation du contenu de l'avenant pour un montant de 10,68 M€ sur 2018-2020

COPIL du 14/11/2017 : report de l'avenant à 2019 (sur demande de l'agence de l'eau vis-à-vis de la cohérence avec le 11° programme)

Réunion du 20/11/2017 : recherche de solutions pour financer les actions 2018 envisagées dans l'avenant

Réunion du 11/10/2018 : information de l'impossibilité de l'agence de l'eau à augmenter son aide via un avenant (cf. budget 11° programme)

- Pas d'avenant au contrat
- Pas de financement des actions non inscrites dans la programmation initiale pour 2019 et 2020

Coordination et financements

Projet d'avenant au contrat

Actions les plus impactées par l'annulation de l'avenant

- B.1.4 Ecopôle (SEAT)
 - surconsommation en 2018
 - enveloppe initiale épuisée
 - années 2019 et 2020 à financer hors contrat

- B.1.7 ENS la Boire des Carrés (Vichy Communauté)
 - pas d'action inscrite dans le contrat pour 2018-2020 (cohérence avec le plan de gestion)
 - solution trouvée pour financer les actions 2018
 - années 2019 et 2020 à financer hors contrat

Coordination et financements

Projet d'avenant au contrat

Actions les plus impactées par l'annulation de l'avenant

- B.2.6 Parc naturel urbain (Vichy Communauté)
 - seules les études ont été réalisées
 - basculement du budget travaux sur l'opération B.2.5 Boucle des Isles, pour élargir le périmètre d'intervention à la rive gauche du lac d'Allier
 - travaux à financer hors contrat ou dans une future programmation

- B.2.7 Saint Germain des Fossés (Vichy Communauté)
 - seules les études inscrites dans le contrat ont été réalisées (pas de travaux prévus initialement)
 - travaux à financer hors contrat ou dans une future programmation

Coordination et financements

Financements Agence de l'eau Loire-Bretagne

2015 : taux initiaux du 10° programme

(contrat : 35% pour l'entretien et 50% pour les autres actions)

2016-2018 : taux révisés du 10° programme

(contrat : 40% pour l'entretien et 60% pour les autres actions)

2019-2020 (*confirmation AELB 25/01/2019*)

- taux révisés du 10° programme (pour les contrats territoriaux signés avant le 1^{er} février 2017)
- enveloppes figurant dans les documents du contrat réévaluées à la hausse en fonction des taux révisés (par sous actions)
- sommes restant à engager calculées par rapport aux aides réellement versées et non sur les aides attribuées

Coordination et financements

Financements européens : FEDER Loire

2015-2018

- Dossiers instruits au fil de l'eau
- Délai d'instruction très long (parfois > 1 an)
- Temps consacré par les maîtres d'ouvrages important :
 - demandes complexes à réaliser
 - demandes de soldes
(nombre important de justificatifs à fournir)
 - contrôles (ex : animation et communication du contrat, contrôles des dossiers 2015-2016 et 2017)
- Un grand nombre d'actions du contrat n'ont pas encore reçu les soldes des dossiers 2015 à 2018
 - ➔ Problèmes de trésorerie pour certaines structures (associations)

Coordination et financements

Financements européens : FEDER Loire

2019-2020 : appels à projets ponctuels uniques

- Dépôt des candidatures : 23/11/2018 au 02/03/2019
- Comité de sélection : 02/04/2019
- Notification de la décision du comité de sélection : à partir du 03/04/2019
- Instruction des demandes de subventions des projets sélectionnés : d'avril à juin 2019
- Programmation des dossiers : de mai à septembre 2019
- Sélection plus importante des projets
 - ➔ Incertitude sur la sélection des actions du contrat
 - ➔ Plans de financements à adapter dans la mesure du possible pour les dossiers non retenus (associations)
- Modification des dépenses éligibles

Animation 2018

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

L'année 2018 a été marquée par une période d'absence de l'animatrice (congé maternité de mi-avril à début août). Bien que remplacée pendant cette période, un nombre plus important de congés pris et une reprise à 80% ont entraîné le retard de certaines actions (ex : bilan à mi-parcours).

Principales missions

- Suivi des autres démarches et études menées sur le territoire en lien avec les thématiques du contrat (SAGE Allier aval, cellules Aster, contrats territoriaux, Natura 2000,...). Présence aux réunions dans la mesure du possible ou à défaut suivi via les comptes rendus de réunions **6 %**

Animation 2018

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

Principales missions

- Suivi technique des actions du contrat **11 %**
- Contribution au fonctionnement de l'Etablissement public Loire et du Service d'Aménagement et de Gestion des Eaux **17 %**, dont :
 - réunions de service et de personnel
 - recrutement pour le remplacement congés maternité et tuilage avec la personne retenue
 - suivi des modalités d'hébergement au sein de l'Hôtel de Région et de la mise à disposition de la personne assurant le secrétariat de la cellule « rivière Allier » (CT et SAGE Allier aval)
 - étude ZEC (cahier des charges et analyse des offres en commun avec le SAGE Loir et le SAGE Yèvre-Auron)

Animation 2018

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

Principales missions

- Suivi financier des actions du contrat **21 %**
 - Suivi des aides liées à l'animation et la communication du contrat (demandes d'aides et de solde, contrôles FEDER Loire)
 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans le montage et le suivi des demandes de subvention (appui hétérogène d'un porteur de projet à l'autre)
 - Réception et transmission aux financeurs des dossiers de demande de subvention

Animation 2018

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

Principales missions

- Communication sur le contrat **22 %**
 - Mise en œuvre d'actions de communication
 - Elaboration de supports de communication
 - Présentation du contrat aux différents acteurs du territoire

Animation 2018

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

Principales missions

- Animation et coordination du contrat **25 %**
 - Lien entre les porteurs de projet et les partenaires financiers
 - Organisation et animation de réunions multi-partenariales. Rédaction des comptes rendus et des relevés de décisions.
 - Suivi et coordination des actions du contrat
 - Réalisation partielle du bilan 2015-2017. Retard notamment dû à la période d'absence de l'animatrice. Au vu du calendrier, il est proposé de réaliser un bilan 2015-2018.

Animation 2019

C1 - Animation et coordination du contrat

Etablissement public Loire

- Poursuite des missions réalisées les années précédentes
- Finalisation du bilan à mi-parcours 2015-2018
 - ➔ présentation au COPIL courant 2019
- Fin 2019 : préparation de l'étude bilan du contrat à mener en 2020 (en partie externalisée)

Communication 2018

C2 - Communication du contrat Etablissement public Loire

Actions réalisées

➤ Lettres d'informations (2*1 700 €) :

- N°4 paru en juin
- N°5 prévu en 2018 et reporté à mars 2019

(cohérence avec la demande de subvention FEDER Loire 2018 qui ne sera instruite que le 28/02/19)

➤ Mise à jour du site internet. Problèmes de visibilité (hébergement commun avec le SAGE Allier aval) et d'architecture (ne permettant pas de faire apparaître toutes les opérations) qui devraient être réglés en 2019.

Hébergement du site internet : 300 €/an



Communication 2018

C2 - Communication du contrat

Etablissement public Loire

Actions réalisées

- Présentation du contrat aux acteurs du territoire. Exemples :
 - A l'occasion de la visite des travaux d'effacement de protection de berge réalisés en 2017 par le CEN Auvergne à La Roche Noire (63) : 18/10/2018 pêche aux cas pratiques organisée par l'ARRA² ; 16/11/2018 visite du Président du comité de bassin Loire-Bretagne
 - 28/03/2018 : Colloque dynamique fluviale (FRANE)
- Journées d'informations
 - Préparation d'une première journée le 03/07/2018 sur la qualité de l'eau qui n'a pu se concrétiser au vu de la l'approche de la période estivale et de la thématique retenue suite à la consultation des partenaires (faible lien avec le contrat)
 - ➔ difficultés à trouver des intervenants

Communication 2018

C2 - Communication du contrat Etablissement public Loire

Actions réalisées

- Journée sur les forêts alluviales
le 09/11/18 (2 500 €)
 - 45 participants
 - présentations en salle le matin (Lempdes 63) avec notamment la présentation des résultats de l'étude A3
 - visite de la forêt alluviale de Dallet l'après-midi et présentation des actions mises en œuvre dans le contrat sur le site de Mezel-Dallet



Communication 2019

C2 - Communication du contrat

Etablissement public Loire

- Actions financées en 2017 et 2018 par :
 - Agence de l'eau Loire-Bretagne
 - FEDER Loire
 - Etablissement public Loire via les contributions des Régions concernées par le territoire du contrat (idem pour l'animation du contrat)

- Pour 2019 : demande du Président de l'Etablissement de réduire les contributions des Régions et Départements
 - ➔ Pour le moment seule l'animation des SAGE et CT portés par l'EP Loire a été inscrit au budget initial de 2019
 - ➔ Ajout des actions de communication au budget complémentaire de mars suivant trésorerie

Communication 2019

C2 - Communication du contrat

Etablissement public Loire

- Actions de communication proposées (à adapter suivant l'autofinancement de l'EP Loire)
 - 1 lettre d'informations à paraître en mars 2019 (programmation 2018)
 - 1 lettre d'informations en septembre/octobre
 - 2 journées d'informations thématiques (à définir)
 - Adaptation du site internet et mise à jour

Ordre du jour

9h45 - 12h15 Réunion

- 1) Rappels
- 2) Point sur les financements et l'animation
- 3) Synthèse des actions 2018 et des perspectives 2019
(détails en annexe 1)
- 4) Présentation des projets de travaux aux Mayères
Agglo Pays d'Issoire
- 5) Présentation des travaux réalisés sur le secteur de la Boucle
des Isles et la rive gauche du Lac d'Allier - Vichy Communauté

Synthèse des actions 2018

Volet A

Connaissance et accompagnement à la gestion de l'espace de mobilité de l'Allier

- 6 actions :
 - 3 en cours
 - 2 terminées
 - 1 reportée à 2019

Coût prévisionnel (documents CT)	Financements sollicités	Coût réel des opérations	Taux moyen d'engagement financier	
			Documents du CT	Demandes d'aide
132 800,00 €	135 240,00 €	135 240,00 €	101,84%	100,00%

Synthèse des actions 2018

Volet A

Connaissance et accompagnement à la gestion de l'espace de mobilité de l'Allier

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Avancement au 07/02/2019
A 1	Cellule dynamique fluviale	CEN Auvergne	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation
A 2	Etude ZEC	EP Loire	Démarrage de l'étude en 2019
A 3	Etude forêts alluviales	CBNMC	Etude finalisée fin 2018
A 4	Etude milieux ouverts	CEN Allier	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation
A 5	Etude gravières	LPO	Etude finalisée début 2017
A 6	Etude avifaune	LPO	1er comptage réalisé en 2016 et 2017 2eme comptage prévu en 2020

Synthèse des actions 2018

Volet B Gestion durable de l'espace de mobilité de l'Allier Sites historiques (B.1)

➤ 9 actions :

- 7 en cours
- 2 terminées vis-à-vis de la programmation du contrat (surconsommation en 2018 et financement hors contrat en 2019 et 2020)

Coût prévisionnel (documents CT)	Financements sollicités	Coût réel des opérations	Taux moyen d'engagement financier	
			Documents du CT	Demandes d'aide
369 841,00 €	417 820,00 €	408 200,00 €	110,37%	97,70%

Synthèse des actions 2018

Volet B

Gestion durable de l'espace de mobilité de l'Allier Sites historiques

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Avancement au 07/02/2019
B.1.1	5 sites historiques en Auvergne	LPO	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation
B.1.2	4 sites historiques dans le 43 et le 63	CEN Auvergne	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation
B.1.3	12 sites historiques dans le 03	CEN Allier	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation
B.1.4	Ecopôle du val d'Allier	SEAT	Actions initiales conformes à la programmation + actions complémentaires en 2018 2019 et 2020 financées hors contrat

Synthèse des actions 2018

Volet B

Gestion durable de l'espace de mobilité de l'Allier Sites historiques (suite)

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Avancement au 07/02/2019
B.1.5	Forêt alluviale de Chadieu	Syndicat de Chadieu	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation
B.1.6	Sentier des Castors	Moulins Communauté	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation
B.1.7	ENS La Boire des Carrés	Vichy Communauté	Actions 2018 non inscrites dans la programmation initiale. Actions 2019-2020 financées hors contrat
B.1.8	ENS des Coqueteaux	Département de l'Allier	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation
B.1.9	ENS du Bec d'Allier	Département de la Nièvre	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation, exceptée l'acquisition foncière

Synthèse des actions 2018

Volet B Gestion durable de l'espace de mobilité de l'Allier Nouveaux sites (B.2)

➤ 8 actions :

- 5 en cours
- 1 reportée à 2019
- 2 terminées vis-à-vis de la programmation du contrat (travaux à financer hors contrat actuel ou dans un prochain contrat)

Coût prévisionnel (documents CT)	Financements sollicités	Coût réel des opérations	Taux moyen d'engagement financier	
			Documents du CT	Demandes d'aide
1 877 000,00 €	5 917 430,00 €	5 537 140,00 €	295,00%	93,57%

Synthèse des actions 2018

Volet B

Gestion durable de l'espace de mobilité de l'Allier Nouveaux sites

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Avancement au 07/02/2019
B.2.1	Acquisitions foncières	CEN Auvergne CEN Allier	Suivant opportunités et concertation de la cellule dynamique fluviale (A1) 36,2 ha acquis depuis 2015
B.2.2	Sites érodables	CEN Auvergne CEN Allier	Gestion conforme à la programmation dans le 43 et 63 Pas de réalisation dans le 03 (contexte plus complexe) Restauration de la dynamique suivant opportunités (2 études et 1 désenrochement réalisés depuis 2015)
B.2.3	Gravières des Mayères	Agglo Pays d'Issoire	Etudes de maîtrise d'œuvre finalisées Travaux de protection et d'aménagement à adapter
B.2.4	Forêt alluviale à Issoire	Agglo Pays d'Issoire	Changement de maîtrise d'ouvrage (CEN Auvergne) Démarrage de l'opération en 2019

Synthèse des actions 2018

Volet B

Gestion durable de l'espace de mobilité de l'Allier Nouveaux sites (suite)

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Avancement au 07/02/2019
B.2.5	3 boucles de l'Allier + rive gauche lac d'Allier	Vichy Communauté	Etudes de maîtrise d'œuvre finalisées en 2017 Travaux démarrés en 2018
B.2.6	Parc naturel urbain	Vichy Communauté	Etudes finalisées en 2017 Travaux à réaliser hors contrat actuel
B.2.7	Saint Germain des Fossés	Vichy Communauté	Etudes finalisées en 2017 Travaux à réaliser hors contrat actuel
B.2.8	Site de Chavennes	Moulins Communauté	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation

Synthèse des actions 2018

Volet C Animation, coordination, communication, évaluation

- 3 actions :
 - 2 en cours
 - 1 dont la réalisation est prévue en 2020

Coût prévisionnel (documents CT)	Financements sollicités	Coût réel des opérations	Taux moyen d'engagement financier	
			Documents du CT	Demandes d'aide
74 400,00 €	73 242,00 €	70 602,00 €	94,90%	96,40%

Synthèse des actions 2018

Volet C

Animation, coordination, communication, évaluation

Fiche action	Intitulé de la fiche	Maître d'ouvrage	Avancement au 07/02/2019
C 1	Animation et coordination du contrat	EP Loire	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation Coût plus important car sous-évalué lors de la rédaction des fiches actions
C 2	Communication	EP Loire	Action en cours de réalisation Globalement conforme à la programmation Coût moins élevé que prévu
C 3	Evaluation des actions du contrat	EP Loire	Préparation de l'évaluation du contrat en 2019 Evaluation à réaliser en 2020

Synthèse des actions 2018

Synthèse globale

- 26 actions au total :
 - 17 en cours
 - 6 terminées
 - 2 reportées à 2019
 - 1 dont la réalisation est prévue en 2020
 - 0 action annulée

Coût prévisionnel (documents CT)	Financements sollicités	Coût réel des opérations	Taux moyen d'engagement financier	
			Documents du CT	Demandes d'aide
2 454 041,00 €	6 543 732,00 €	6 151 182,00 €	250,66%	94,00%

Ordre du jour

9h45 - 12h15 Réunion

- 1) Rappels
- 2) Point sur les financements et l'animation
- 3) Synthèse des actions 2018 et des perspectives 2019
- 4) Présentation des projets de travaux aux Mayères
Agglo Pays d'Issoire (*diaporama annexe 2*)
- 5) Présentation des travaux réalisés sur le secteur de la Boucle
des Isles et la rive gauche du Lac d'Allier
Vichy Communauté (*diaporama annexe 3*)

Partenaires du contrat



Agence de l'eau
Loire-Bretagne

Etablissement public du ministère
chargé du développement durable



UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen de Développement Régional

Cette opération est cofinancée par
l'Union européenne.
L'Europe s'engage dans le bassin de
la Loire avec le Fonds européen de
développement régional.



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



PUY-DE-DÔME
LE DÉPARTEMENT



Haute-Loire
le DÉPARTEMENT



Allier
le Département



Conservatoire
d'espaces naturels
Auvergne



Conservatoire
d'espaces naturels
Allier



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



nièvre
le département



VICHYCOMMUNAUTÉ



AGGLO
PAYS
D'ISSOIRE

Conservatoire Botanique National



MASSIF CENTRAL



Moulins
Communauté
Ensemble, construisons notre avenir

Contact

Etablissement public Loire

Amandine DEGUILHEM

Animatrice du contrat val d'Allier alluvial

amandine.deguilhem@eptb-loire.fr

04.43.86.11.11

Clermont-Ferrand (63)

<http://www.sage-allier-aval.fr/ctvalallier/>



Plus d'information sur l'Etablissement public Loire :

<http://www.eptb-loire.fr/>

